

□ 재원확보 방안

- (환 경 부) '22년 국비 350백만원 확보
- (경상북도) '22년 도비 105백만원 확보
- (환 경 부) '23년 국비 5,000백만원 지원 건의
- (경상북도) '23년 도비 1,500백만원 지원 건의

□ 연도별 추진계획

구 분	추진계획	진도율(%)
2022	- 추진계획 수립 및 '22 사업비 확보('23 국비 신청)	10
2022	- 사업대상지 추가검토를 위한 기본구상 및 타당성 조사	20
2022	- 주민설명회 개최 및 부지확보, 국립공원공단과 위·수탁 협약 체결	30
2022	- 용도지구 변경 및 전략환경영향평가 등 행정절차 이행	40
2023	- 실시설계 용역	60
2023	- 착공	70
2024	- 준공	100
임기후		

□ 사전 검토사항


- 관련 법령 및 계획사항

법령(계획)명	검토기준	현 황	저촉여부	비 고
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 (71조, 84조, 85조)	(보전관리지역에서 계획관리지역으로 변경 시) - 건폐율(40% 이하) - 용적율(100% 이하)	- 조건에 부합하도록 설계 예정	부	
농지법 제34조	- 농지전용 허가	- 대상	부	
자연재해대책법 5조, 시행령 6조 재해영향평가등 협의실무지침	- 재해영향검토(47종/37개 법령) - 재해영향평가 및 소규모재해영향평가 (59종/47개 법령) * 소규모 : 면적 5천~5만㎡ * 재해영향평가 : 면적 5만㎡~	- 대상	부	
매장문화재법 6조, 시행령 4조	- 문화재 지표조사 (사업면적 3만㎡ 이상)	- 대상	부	
환경영향평가법 시행령	전략환경영향평가 * 군계획시설, 총공사비 500억이상 등	- 대상	부	
	소규모환경영향평가 * 국토계획법상 기반시설, 관리지역, 농림지역, 자연환경보전지역 등	- 대상	부	

○ 관련기관 및 부서 협의사항

협력 기관(부서)	논의 내용	논의 결과	비 고
주민의견 수렴	주민설명회 개최	주민설명회 개최 완료, 부지매입이 원활히 추진되도록 노력	'22. 09. 개최 완료
환경부	사업대상지 변경 승인	사업대상지 변경 승인 완료	'22. 09. 변경 완료
경상북도	용도지구 변경을 위한 협의	용도지구 변경을 위한 협의 차 경상북도에 방문 예정	'23. 상반기 방문 예정

□ 추진절차

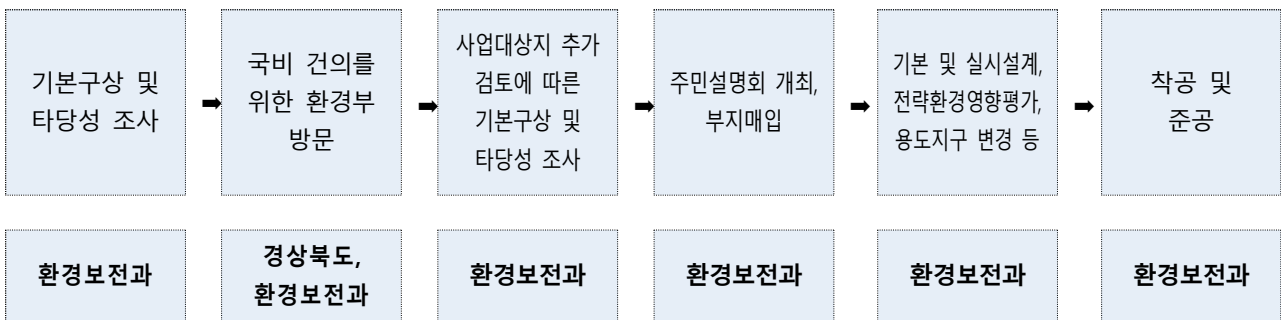

□ 추진현황 및 계획

- '21. 02. : 기본구상 및 타당성조사 용역시행(영양군)
- '21. 03. : 국비 건의 요청을 위한 환경부 방문(경북도청, 영양군)
- '22. 06. ~ '22. 08. : 사업대상지 추가 검토에 따른 기본구상 및 타당성 조사
- '22. 09. ~ '23. 08. : 용도지구 변경 등, 기본 및 실시설계, 행정절차
- '23. 09. ~ '24. 12. : 착공 및 준공

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 사업대상지 변경에 따른 용도지구 변경에 1년 정도 소요, 부지 확보, 인허가 절차 등에 기간 소요
- ▶ (대 책) 주민설명회 및 주민 협의를 통하여 원활한 부지매입 추진, 용도지구 변경에 대한 협조 요청을 위하여 경상북도 방문

□ 위치도



< 수비면 죽파리 375번지 일원 >

검토 의견	
담당부서	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생태자원을 바탕으로 체류형 생태관광기반을 조성하고, 생태계서비스 증진과 그린뉴딜 일자리 창출, 지역주민의 소득 증진을 위하여 필요한 시설 ○ 조성 후 전시·교육·체험 등을 통하여 생태관광지역의 활성화를 위한 시설로 활용할 계획 ○ 임기내 준공을 목표로 하여 적극 추진 중에 있음
총괄부서	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현재 사업 추진을 위한 일부 예산을 확보하였으며, 사업대상지 변경에 대한 승인을 받음 ○ 사전철자 이행이 원활할 경우 임기 내 추진은 무난하게 가능함
