

관리번호
7-3

멸종위기종복원센터 교육관 건립

사업구분	계속	사업주체	환경부	부서장	임형수(☎6025)
완료시기	임기내	추진부서	환경보전과 (환경관리팀)	팀 장	김미경(☎6510)
사업성격	예산	협조부서	-	담당자	김혜진(☎6514)

<공 약 목 표>

멸종위기 야생생물 증식·복원 관련 전문가 양성 및 센터 직원 및 주민 생활편익 향상

□ 근거법령

- 국립생태원의 설립 및 운영에 관한 법률 제5조의2(멸종위기종복원 센터의 설치) 제2항 4호
- 환경부 ‘멸종위기 야생생물 보전 종합계획(2018~2027)’ 전략2-3(서식지 외보전기관 기능 강화 및 복원사업 안정화), 전략2-4(종 보전 전문인력 양성)
- 멸종위기종복원센터(교육시설 포함) 건립사업 예비타당성 조사 결과 종합평가에서 AHP 0.512로 교육시설 건립 타당성 확보(한국개발연구원, 2011년)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. ~ 2023.(3년)
- 위 치 : 영양군 영양읍 대천리(종복원센터 부지 內)
- 사 업 비 : 3,652백만원(국비 3,652)
- 사업규모 : 연면적 1,161.05㎡(건축면적 517.8㎡), 지상 3층, 지하 1층
- 사업내용 : 멸종위기 야생생물 전문 교육을 위한 교육관 건립

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	임기내							임기후
		소계	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
계	3,652	3,652	152	1,750	1,750	0	0	0	0
국 비	3,652	3,652	152	1,750	1,750	-	-	-	-
도 비	0	0	-	-	-	-	-	-	-
군 비	0	0	-	-	-	-	-	-	-
기 타	0	0	-	-	-	-	-	-	-

□ 재원확보 방안

- (환경부) '21년 설계용역비 152백만원 확보
- (환경부) '22년 공사비 1,750백만원 확보
- (환경부) '23년 공사비 1,750백만원 교부 예정

□ 연도별 추진계획

구 분	추진계획	진도율(%)
2022	기본 및 실시설계 완료	30
2022	착공	50
2023	준공	95
2024	개관	100
임기후		

□ 사전 검토사항


- 관련 법령 및 계획사항

법령(계획)명	검토기준	현황	저촉여부	비고
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 (71조, 84조, 85조)	- 제1종일반주거지역 - 건폐율(60% 이내) - 용적율(제한 X)	- 제2종 건축물 - 60% 이내 - X	부	
영양군 계획조례 (56조, 61조)	- 농업진흥구역 행위제한 - 농지전용 허가제한대상(아파트 등)	- 비대상	부	
자연재해대책법 5조, 시행령 6조 재해영향평가등 협의실무지침	- 재해영향검토(47종/37개 법령) - 재해영향평가 및 소규모재해영향평가 (59종/47개 법령) * 소규모 : 면적 5천~5만㎡ * 재해영향평가 : 면적 5만㎡~	- 비대상	부	
매장문화재법 6조, 시행령 4조	- 문화재 지표조사 (사업면적 3만㎡ 이상)	- 비대상	부	
환경영향평가법 시행령	전략환경영향평가 * 군계획시설, 총공사비 500억이상 등	- 비대상	부	
	약식전략환경영향평가 * 항만, 도로, 수자원, 도시공원, 도시, 주거환경정비, 교통정비	- 비대상	부	
	환경영향평가 * 도시개발, 군계획시설 등	- 비대상	부	
	소규모환경영향평가 * 국토계획법상 기반시설, 관리지역, 농림지역, 자연환경보전지역 등	- 비대상	부	
낙동강수계법 5조	수변구역 행위제한	- 비대상	부	

○ 관련기관 및 부서 협의사항

협력 기관(부서)	논의 내용	논의 결과	비 고
환경부 자연정책과	교육관 건립 추진 사업계획 및 업무협의	건립 사업 계획안 및 설명	'20. 09
기획재정부 고용환경예산과	교육관 건립 추진 설명 및 협의	교육관 건립 예산 확보 사항 협의	'20. 11
국가공공건축지원센터	공공건축 사업계획서 사전 검토	교육관 건립 전반에 대한 점검	'21. 03.
영양군 종합민원과	교육관 건립 부지 실시설계인가 및 변경고시 관련(건축협의)	협의의견 및 조치계획 송부	'22. 03.

□ 추진절차

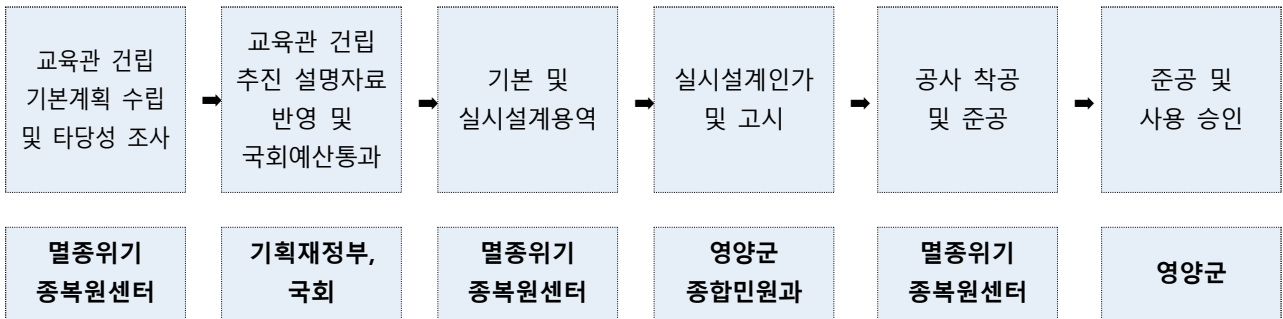

□ 추진현황 및 계획

- '19. 08. : 교육관 건립 타당성조사 용역 추진(종복원센터)
- '19. 10. : 환경부 '20년 예산안(신규사업) 반영, 기재부 예산심의 미반영
- '20. 06. : 기초자료 조사
- '21. 03. ~ '22. 05. : 기본 및 실시설계
- '22. 12. : 공사 착공
- '23. 12. : 공사 준공('24. 개관)

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 교육관 건립 추진 시점('19)보다 자재단가 상승하여 사업 면적 조정
 - ▶ (대 책) 연 면 적 : 당초 1,319.28㎡ → 변경 1,161.05㎡
 - 건축면적 : 당초 577.15㎡ → 변경 517.8㎡

□ 위치도



< 영양군 영양읍 대천리 일원 >

검토 의견

담당부서

- 종복원 전문인력 양성을 통한 복원사업의 성공 및 대국민 인식 증진을 위하여 반드시 필요한 시설
- 현장중심 체험형 교육과정 운영, 지역 방문객 유치를 통한 지역경제활성화 및 지역균형발전에 기여 가능
- 현재 상태로 추진하면 '24년도 초에 개관할 수 있을 것으로 판단

총괄부서 (기획예산실)

- 환경부에서 추진하고 있는 사업으로 사업 관련한 사전절차는 완료한 상황임
- 현 사업추진 상황으로는 임기 내 조기에 이행이 완료될 것으로 판단됨
