

관리번호
3-12

토구 급경사지 붕괴위험지구 정비사업

사업구분	계속	사업주체	영양군청	부서장	오형원(☎6028)
완료시기	임기내	추진부서	건설안전과 (재난방재팀)	팀 장	신현경(☎6750)
사업성격	예산	협조부서	-	담당자	우영일(☎6751)

<공 약 목 표>

낙석 사고로부터 도로 이용자(운전자 및 마을주민)의 안전 도모

□ 근거법령

- 자연재해대책법 제12조(자연재해위험개선지구의 지정 등)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. ~ 2024.(4년간)
- 위 치 : 청기면 토구리 산73번지 일원
- 사 업 비 : 14,000백만원(국비 7,000 도비 2,100 군비 4,900)
- 사업내용 : 도로선형개량
 - 도로개설 L=764m
 - 교량 2개소(L=162m, L=134m)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	임기내						임기후
		계	2022까지	2023	2024	2025	2026	
계	14,000	14,000	2,500	5,000	6,500	0	0	0
국 비	7,000	7,000	1,250	2,500	3,250	-	-	-
도 비	2,100	2,100	375	750	975	-	-	-
군 비	4,900	4,900	875	1,750	2,275	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-	-	-	-

□ 재원확보 방안

- (행정안전부) '21년도 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 확정 후 연차별 추진 중

□ 연도별 추진계획

구 분	추진 계획	진도율(%)
~2021	사업비 확보 및 행정절차 수행	5
2022	실시설계용역 완료, 공사 착공	50
2023	공사 시공	75
2024	준공	100
2025		
2026		
임기후		

□ 사전 검토사항


- 관련 법령 및 계획사항

법령(계획)명	검토기준	현 황	저촉여부	비 고
국토의 계획 및 이용에 관한 법률	- 군관리계획 시설결정 변경	- 대상	부	
환경영향평가법 시행령	소규모환경영향평가 * 국토계획법상 기반시설, 관리지역, 농림지역, 자연환경보전지역 등	- 대상	부	

- 관련기관 및 부서 협의사항

협력 기관(부서)	논의 내용	논의 결과	비 고
행정안전부	사전설계검토	협의 완료	'22.06
대구지방환경청	소규모환경영향평가 현장 확인	협의 중	'22.08

□ 추진절차



□ 추진현황 및 계획

<추진실적>

- '21. 03. : 실시설계용역 착수
- '21. 06. : 주민설명회 개최 및 지구지정 변경협의(도로선형개량)
- '21. 07. : 행안부 토구 급경사지 붕괴위험지역 지구지정(변경) 고시
- '22. 07. : 행안부 사전설계검토 완료


<향후계획>

- '22. 08. : 소규모환경영향평가 협의
- '22. 10. : 설계VE 및 지방건설기술심의 등(총 공사비100억원 이상)
- '22. 12. : 실시설계용역 완료 및 공사 착공

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 사전설계검토 등 협의 지연
 - ▶ (대 책) 행안부 직접 방문 및 지속적인 건의(피암터널→도로선형개량) 협의 완료

□ 위치도

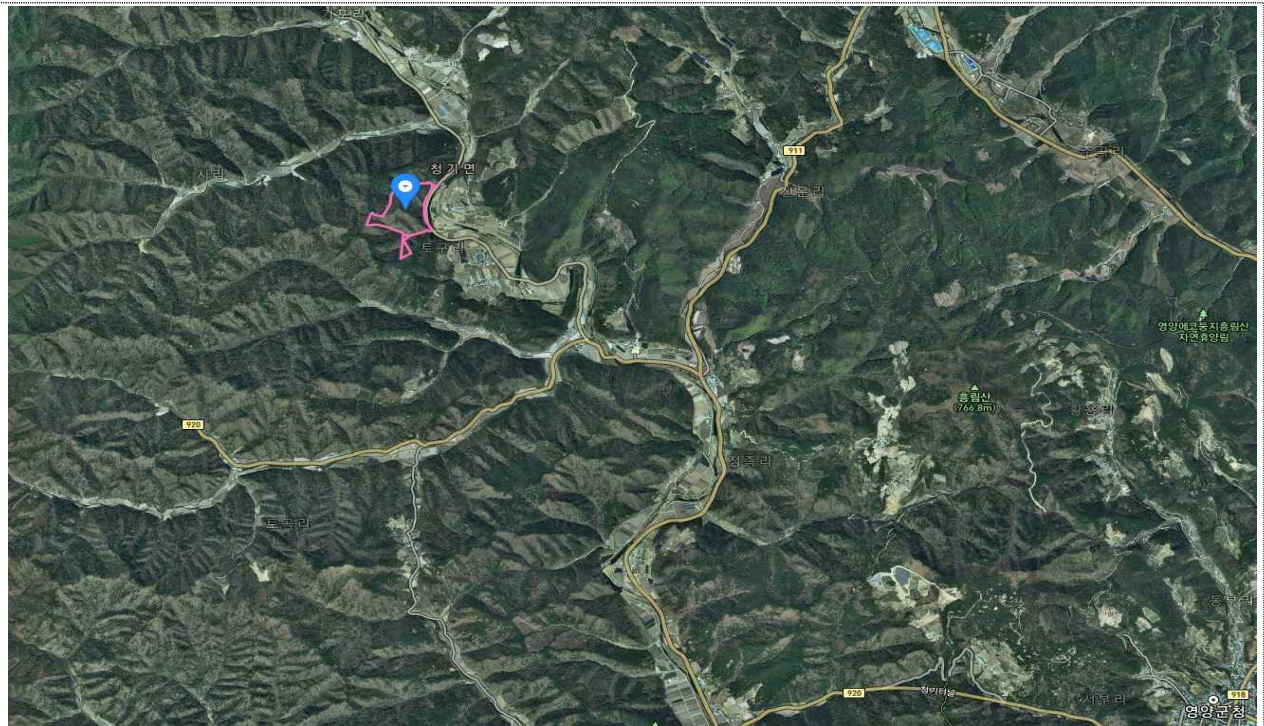

< 청기면 토구리 산73번지 일원 >

검토 의견

담당부서

- 붕괴위험지구 준비를 통해 지역의 교통안전 및 생활여건 개선 기대
- 사업추진을 위한 지구지정 및 사업조기시행 지속적 건의
- 21년도 신규사업으로 정상 추진 중

총괄부서 (기획예산실)

- 21년 사업선정에 따른 연차별 추진계획에 따라 순조롭게 추진되고 있음
- 자원 및 관련절차 협의가 완료되어 공약이행 가능할 것으로 판단됨
