

관리번호  
9-4

## 영양군립 공원묘원 조성

사업구분	신규	사업주체	영양군	부서장	이선정(☎6022)
완료시기	임기후	추진부서	주민복지과 (어르신복지팀)	팀 장	이재남(☎6240)
사업성격	예산	협조부서		담당자	김찬규(☎6242)

### <공 약 목 표>

우리군 실정에 맞는 환경 친화적이고 품격있는 공원묘원 조성으로  
타 지역 시설을 이용하는 지역주민들의 불편 해소 및 장사복지 증진

#### □ 근거법령

- 장사 등에 관한 법률 제4조(국가와 지방자치단체의 책무)
- 장사 등에 관한 법률 제13조(공설묘지 등의 설치)

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2028.(6년)
- 사업위치 : 영양읍 동부리 산73번지 일원
- 사 업 비 : 23,940백만원(국비 2,100 도비 450 군비 21,390)
- 사업규모 : 100,000㎡(봉안당 3,000기, 봉안묘 20,000기)
- 사업내용
  - 봉안당, 봉안묘 등 장사시설 조성, 진입로 확장
  - 주차장 및 기타 부대시설(편의시설, 공원조성 등) 조성

#### □ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	임기내						임기후
		계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	23,940	23,940	22	1,766	130	21,022	1,000	0
국 비	2,100	2,100	-	-	-	2,100	-	-
도 비	450	450	-	-	-	450	-	-
군 비	21,390	21,390	22	1,766	130	18,472	1,000	-
기 타	0	0	-	-	-	-	-	-

## □ 재원확보 방안

- (행정안전부) 2025년 대비 지방소멸대응기금 확보(기금)
- (보건복지부) 2025년 장사시설 설치사업 국비 확보(국비 70%)

구분	봉안당	자연장지	비고
지원기준	m <sup>2</sup> 당	m <sup>2</sup> 당	
단가	1,500,000원	100,000원	
보조비율	70%	70%	
지원금액	1,050,000원	70,000원	

## □ 연도별 추진계획


구분	추진계획	진도율(%)
2022	추진계획 수립, 기본구상 및 타당성 조사 용역	5
2023	관련조례 제정, 장사시설(진입도로) 인허가 및 설계용역 착수 지적현황측량 및 지장물(분묘포함) 조사 재해영향성 검토, 재해영향평가 및 문화재지표조사 용역 착수	20
2024	사전절차 이행(소규모환경영향평가 용역 착수), 부지매입, 지장물보상 설계VE 용역 착수	30
2025	BF예비인증 용역 착수, 분묘이장 및 무연분묘 개장	50
2026	공사입찰(장사시설 착공), 진입로 등 기반공사 착공 및 준공	80
임기후	장사시설 준공, 관리시설 운영인력 확보 및 정상운영	100

## □ 사전 검토사항

- 관련기관 및 부서 협의사항

협력 기관(부서)	논의 내용	논의 결과	비고
지역개발과(도시팀)	군관리계획 결정 검토	군관리계획 신청 예정	
농업축산과(농정기획팀) 산림녹지과(산지이용팀)	농지 및 산지전용 허가	농지 및 산지전용 신청 예정	
재무과(재산관리팀)	(중기)공유재산관리계획 포함	관리계획 포함, 부지매입 예정	
주민의견 수렴	주민공청회 개최	주민공청회 실시 예정	

## □ 추진절차



## □ 추진현황 및 계획

- '22. 07. ~ 09. : 추진계획 수립 및 타지자체 벤치마킹
- '22. 11. ~ '23. 02. : 기본계획 및 타당성 조사용역
- '23. ~ '25. : 분묘조사 및 사전 행정절차 이행, 관련조례 제정
  - 지방재정 투융자 및 공유재산관리계획 심사
  - 장사시설(진입도로) 인허가 및 설계 용역
  - 재해영향성평가 및 소규모환경영향평가 등 용역
  - 지형현황측량 및 지장물(분묘포함) 조사, 분묘조사
  - 분묘이장 및 부연분묘 개장
  - BF예비인증 용역, 건축규모에 따른 인증 용역(녹색건축/에너지효율 등)
  - 부지매입 및 지장물 보상
  - 설치지역 재정지원금 지원
- '26. ~ '28. : 기반공사(진입도로 등) 및 장사시설 조성공사 착공 및 준공


## □ 문제점 및 대책

- (문제점) 장사시설에 대한 부정적인 이미지로 주민반대가 예상됨
  - ▶ (대책) 주민공청회, 선진지 견학 등을 통하여 주민인식 전환

## □ 기대효과

- 현대식 장사시설 확보로 군민의 인근시군 시설이용 불편 해소
- 장사문화의 개선(매장⇒ 화장⇒ 자연장지, 봉안 등)으로 불법묘지 조성 예방

## □ 위치도

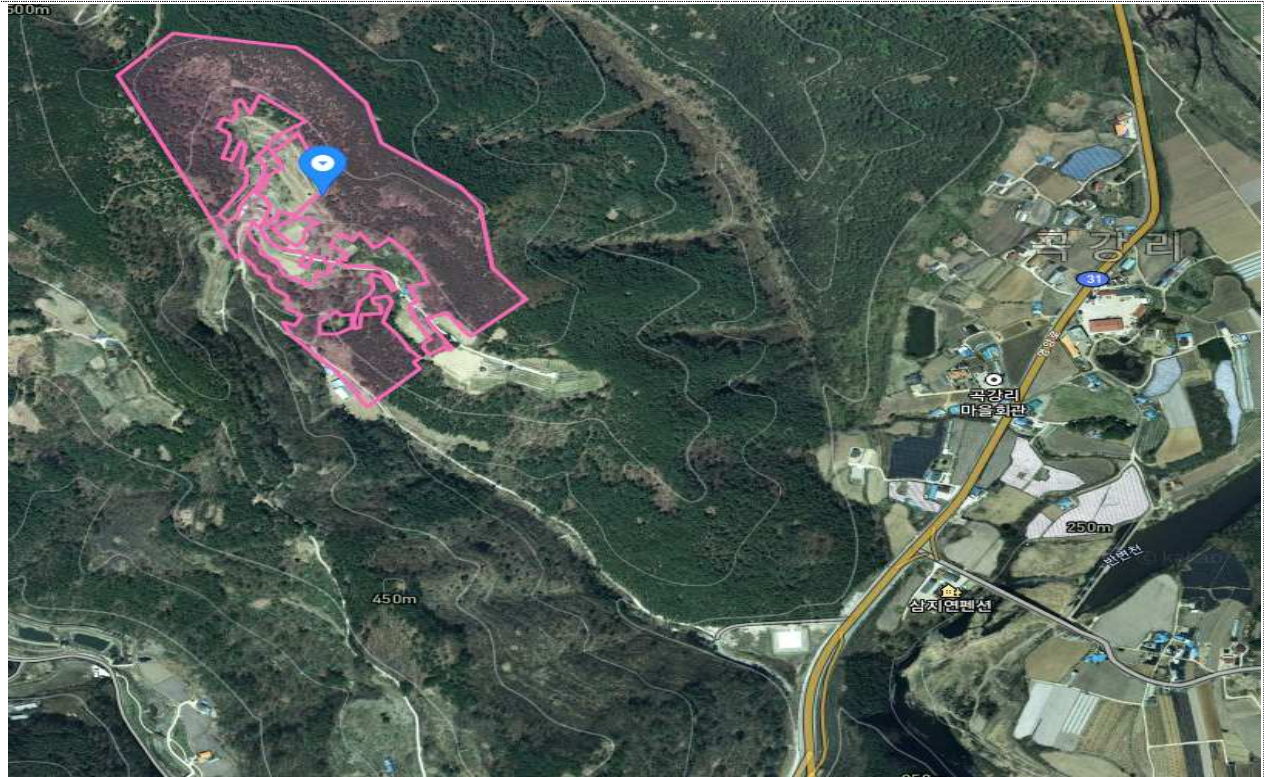

< 영양읍 동부리 산 73번지 일원 >

### 검토 의견

<p><b>담당부서</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역 내 고령인구 및 화장률 증가 등 장사문화의 변화에 능동적으로 대처 및 타 지자체 장사시설 이용으로 인한 주민 불편을 해소하고 무분별한 국토 훼손 방지를 위해 필요한 사업으로 공약사항으로 추진함이 타당하다고 판단됨</li> <li>○ 장사수요 예측 및 사업의 타당성 조사를 통해 사업 부지를 확정하고, 장사시설 설치사업 국고보조 예산 확보 등을 통한 적극적인 추진으로 임기 내 기반조성이 가능할 것으로 판단됨</li> </ul>
<p><b>총괄부서 (기획예산실)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 타 지역 장사시설 이용에 따른 지역민의 불편을 해소하고, 고향사랑기부제와 연계한 향우민의 애향심을 높이는 계기가 되어 공약의 타당성은 적합함</li> <li>○ 하지만 최근 장례시설 설치와 관련된 지역의 각종 갈등사례를 참고하여 충분한 주민의견 수렴과 사전절차 이행이 수반된다면 공약이행에 문제가 없을 것으로 생각됨</li> </ul>
